



Libero Consorzio Comunale di Siracusa

VIII Settore - Viabilità

733/23

Prot. VIII sett. n° 2625 del 20/12/2023

Spazio riservato al
Protocollo Generale

Alla ditta P.M. Innovative Engineering Srl
studiopm@mypec.eu
Spett. ANAS
ordinanze@postacert.stradeanas.it
Alla Prefettura di Siracusa
protocollo.prefsr@pec.interno.it
Alla Questura di Siracusa
dipps178.00F0@pecps.poliziadistato.it
Al Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa
tsr28741@pec.carabinieri.it
Al Comune di Augusta
protocollocomunediaugusta@pointpec.it
Alla Commissariato di Pubblica Sicurezza di Augusta
dipps178.5100@pecps.poliziadistato.it
Al Comando Carabinieri di Augusta
sts28741@carabinieri.it
Al Comando dei Vigili del Fuoco di Augusta
dist.sr04.augustaterra@vigilifuoco.it
Al servizio 118 – c/o Ospedale Cannizzaro
Via Messina n° 826 – Catania
col18ctsrreg@pec.aoc.it
alla Polizia Provinciale Sede
poliziaprovinciale@pec.provincia.siracusa.it
Al responsabile del Servizio 1
Geom. Paolo Sequenzia
Al Capo del IV Settore Sede

OGGETTO: Autorizzazione di apertura cantiere ai sensi degli Artt. 21 e 26 del Codice delle Strada sulle S.P. N.C. Ramo Secco e S.P. N.C accesso al porto commerciale di Augusta.

In allegato, si trasmette l'Autorizzazione di apertura cantiere stradale di cui all'oggetto emessa ai sensi degli artt. 21 e 26 del Codice della Strada.



P. Il Capo Settore
Dott. Giovanni Grimaldi

Paolo Sequenzia



Libero Consorzio Comunale di Siracusa

VIII Settore - Viabilità

OGGETTO: Autorizzazione di apertura cantiere ai sensi degli Artt. 21 e 26 del Codice delle Strada sulle S.P. N.C. Ramo Secco e S.P. N.C. accesso al porto commerciale di Augusta.

IL CAPO DEL SETTORE

Vista la richiesta Prot. Gen. n. 56925 del 04.12.2023 da parte della società P.M. Innovative Engineering Srl la quale ha chiesto l'autorizzazione ai sensi degli Artt. 21 e 26 del C.d.S. per lavori di adeguamento della sede stradale e di messa in sicurezza per il passaggio di trasporti eccezionali sulle S.P. N.C. Ramo Secco e S.P. N.C. accesso al porto commerciale di Augusta;

Vista la relazione tecnica descrittiva dell'Ing. Paolo Montefinese concernente opere di adeguamento temporaneo lungo la SP NC Accesso al Porto Commerciale di Augusta e la SP NC Ramo Secco per permettere il transito di veicoli – convogli per trasporti eccezionali;

Preso Atto che tali lavori saranno eseguiti per il tempo necessario al passaggio dei trasporti eccezionali per poi essere ripristinato il precedente stato dei luoghi;

AUTORIZZA

ai sensi degli Artt. 21 e 26 del Codice della Strada la società P.M. Innovative Engineering Srl ad eseguire i lavori di adeguamento della sede stradale e di messa in sicurezza per il passaggio di trasporti eccezionali lungo la S.P. N.C. Ramo Secco e la SP NC Accesso al Porto Commerciale di Augusta.

I lavori inizieranno il 22.12.2023 e termineranno il 10.03.2024.

DISPONE

Alla ditta P.M. Innovative Engineering Srl:

- di dotare il cantiere stradale di ogni sistema di segnalamento temporaneo mediante l'impiego di specifica segnaletica, così come previsto dal C.d.S. e dal regolamento di Attuazione ed Esecuzione al C.d.S. e ss.mm.ii., degli Artt. 30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43;
- **di adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché i lavori non siano da intralcio alla circolazione stradale ed alla visibilità di altra segnaletica esistente;**
- di adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale e mantenerli in perfetta efficienza;
- di provvedere a rendere visibile il personale (**movieri del traffico**) addetto ai lavori esposto al traffico veicolare, con appositi dispositivi di protezione individuali previsti dal C. d S. e dalle Leggi vigenti in materia di sicurezza;
- di eliminare ogni fonte di pericolo durante l'esecuzione dei lavori, sollevando questo Ente da ogni responsabilità civile e penale derivante da qualsivoglia inosservanza, incuria o negligenza o comunque, da fatti attinenti l'andamento del cantiere tali da determinare nocuenti;
- di modificare la velocità massima consentita a 20 km/h in prossimità dell'area di cantiere.

AVVERTE

Che l'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente è punita con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada e ss.mm.ii. e dalle leggi vigenti in materia;

Che a norma dell'Art. 3 c. 4 della legge 7 Agosto 1990 n. 241 avverso la presente autorizzazione, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al TAR Sicilia entro giorni 60 dalla pubblicazione;

Che della presente autorizzazione sarà data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione all'albo pretorio di questo Ente e dei comuni interessati.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente Autorizzazione.

La presente autorizzazione non sostituisce ogni altra Concessione, Autorizzazione o Nulla Osta di competenza di altri Enti, organi o privati, sollevando questo Ente da ogni responsabilità civile o penale.

Si allega altresì le relazioni tecniche descrittive a firma dell'Ing. Paolo Montefinese che costituiscono parte integrante del provvedimento di autorizzazione rilasciato.



Il Capo Settore
Dott. Giovanni Grimaldi

Paolo Montefinese

Il Capo del Servizio
P. Riccardo Cannata

Paolo Montefinese

Regione Sicilia

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Opere di adeguamento temporaneo della viabilità lungo la viabilità asse di penetrazione Villasmundo (SPNC denominata "Ramo Secco"), per permettere il passaggio di un convoglio eccezionale per il trasporto di componenti di turbine eoliche che costituiranno il Parco Eolico denominato "Mineo Militello Vizzini"

ELABORATO:

RT

TITOLO:

RELAZIONE TECNICA
DESCRITTIVA

RICHIEDENTE:

PM
Innovative Engineering

Studio PM S.r.l.

Via dell'Artigianato, 27, 75100 Matera (MT)

P. IVA: 01221180779

PEC: studiopm@mypec.eu

REV

DATA

DESCRIZIONE

ELABORATO

0

1/12/2023

RT

DATA:

1/12/2023

SCALA:

IL TECNICO

Paolo 

MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE

(D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445 art. 46)

Il/La sottoscritto/a PAOLO MONTEFINESE

Nato/a a: BARI (prov. BA) il 25/10/1975

e residente a MATERA (MT), PIAZZA MICHELE BIANCO n° 28 (CAP 75100) in qualità di legale rappresentante dell'impresa

STUDIO PM S.R.L., P. IVA: 01221180779,

SEDE LEGALE: VIA DELL'ARTIGIANATO, 27 – MATERA (MT)

dichiara che la marca da bollo utilizzata nell'allegata istanza, trasmessa per via telematica, ha:

numero identificativo: 01220412030875;

data di emissione: 30/11/2023;

è di importo pari a €: 16,00;

è stata annullata nei modi previsti dalla legge;

l'originale della stessa rimane custodita a cura del dichiarante

Il sottoscritto è consapevole:

1. di essere penalmente responsabile se rilascia false dichiarazioni (art. 76 DPR 445/2000);
2. di decadere dai benefici a seguito di un provvedimento adottato sulla base delle false dichiarazioni (art. 75 DPR 445/2000).

Data

30/11/2023

Firma


(allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità nel caso non sia già allegato alla istanza cui si fa riferimento o firmare digitalmente)

	Documento	RELAZIONE TECNICO - DESCRITTIVA		
	Ente	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA		
	Progetto	PARCO EOLICO "MINEO MILITELLO VIZZINI"		
	Revisione	00	Data	23/10/2023

2 Interventi temporanei che si renderanno necessari

Lungo il percorso insistono alcune opere che potrebbero interferire con il carico o con il mezzo. Per tale motivo se ne richiede la manomissione temporanea.

Durante le lavorazioni e nel periodo in cui insisteranno gli interventi, sarà adottata segnaletica da cantiere come da D.M. 10 luglio 2002.

2.1 VIABILITA' EX ASI n. 1 SVINCOLO PORTO COMMERCIALE DI AUGUSTA, RAMPA DI INNESTO S.S.193 VERSO AUGUSTA (Km 2+000) (N 37.2453416° E 15.178638°) (OBS 2.01)

A causa dell'ingombro dei carichi, si renderanno necessari i seguenti interventi:

- rimozione dell'albero posto sul lato sinistro della carreggiata e pulizia della vegetazione per un'altezza di 3 m;
- rimozione del palo di illuminazione posto sul lato destro della carreggiata;
- pulizia della vegetazione per un'altezza di 1 m sul lato destro della carreggiata.

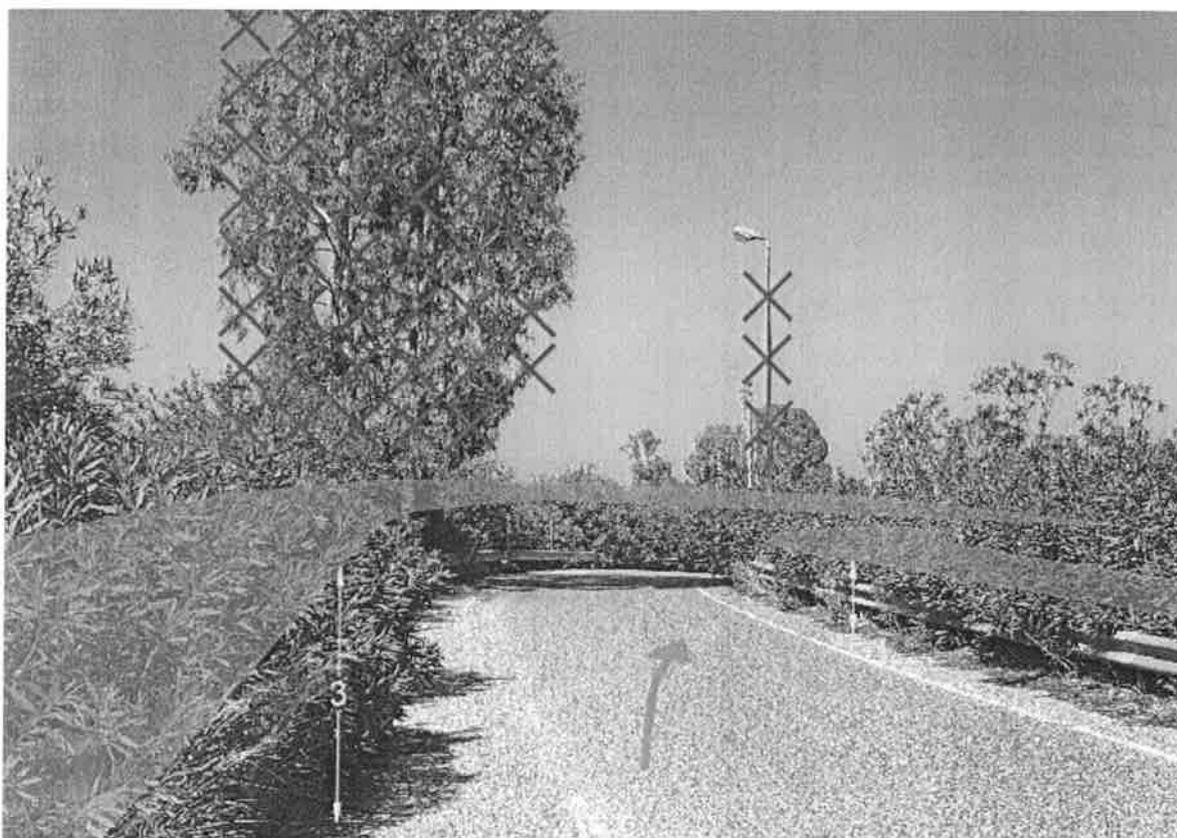


Figura 2.1 – Foto delle lavorazioni da effettuare

Documento	RELAZIONE TECNICO - DESCRITTIVA		
Ente	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA		
Progetto	PARCO EOLICO "MINEO MILITELLO VIZZINI"		
Revisione	00	Data	23/10/2023



Figura 2.1 – Planimetria indicazione interventi

 	Documento	RELAZIONE TECNICO - DESCRITTIVA		
	Ente	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA		
	Progetto	PARCO EOLICO "MINEO MILITELLO VIZZINI"		
	Revisione	00	Data	23/10/2023

2.2 VIABILITA' EX ASI n. 1 SVINCOLO PORTO COMMERCIALE DI AUGUSTA, RAMPA DI INNESTO S.S.193 VERSO AUGUSTA (Km 2+000) (N 37.2454° E 15.17871°) (OBS 2.02)

A causa dell'ingombro dei carichi, si richiedono i seguenti interventi:

- sul lato destro della strada dovrà essere effettuata una pulizia del verde per un'altezza di 1 m, mentre sul lato sinistro per un'altezza di 3 m per tutta la lunghezza del raggio di curvatura.



Figura 2.2 – Foto delle lavorazioni da effettuare

 	Documento	RELAZIONE TECNICO - DESCRITTIVA		
	Ente	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA		
	Progetto	PARCO EOLICO "MINEO MILITELLO VIZZINI"		
	Revisione	00	Data	23/10/2023



Figura 2.2 – Planimetria indicazione interventi

 	Documento	RELAZIONE TECNICO - DESCRITTIVA		
	Ente	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA		
	Progetto	PARCO EOLICO "MINEO MILITELLO VIZZINI"		
	Revisione	00	Data	23/10/2023

2.3 VIABILITA' EX ASI n. 1 SVINCOLO PORTO COMMERCIALE DI AUGUSTA, RAMPA DI INNESTO S.S.193 VERSO AUGUSTA (Km 2+000) (N 37.2457°, E 15.17878°) (OBS 2.03)

A causa dell'ingombro dei carichi, si richiedono i seguenti interventi:

- sul lato destro della strada dovrà essere effettuata una pulizia del verde per un'altezza di 1 m, mentre sul lato sinistro per un'altezza di 3 m per tutta la lunghezza del raggio di curvatura;
- rimozione di un palo di illuminazione collocato sul lato destro della strada.



Figura 2.3 – Foto delle lavorazioni da effettuare

Documento	RELAZIONE TECNICO - DESCRITTIVA		
Ente	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA		
Progetto	PARCO EOLICO "MINEO MILITELLO VIZZINI"		
Revisione	00	Data	23/10/2023

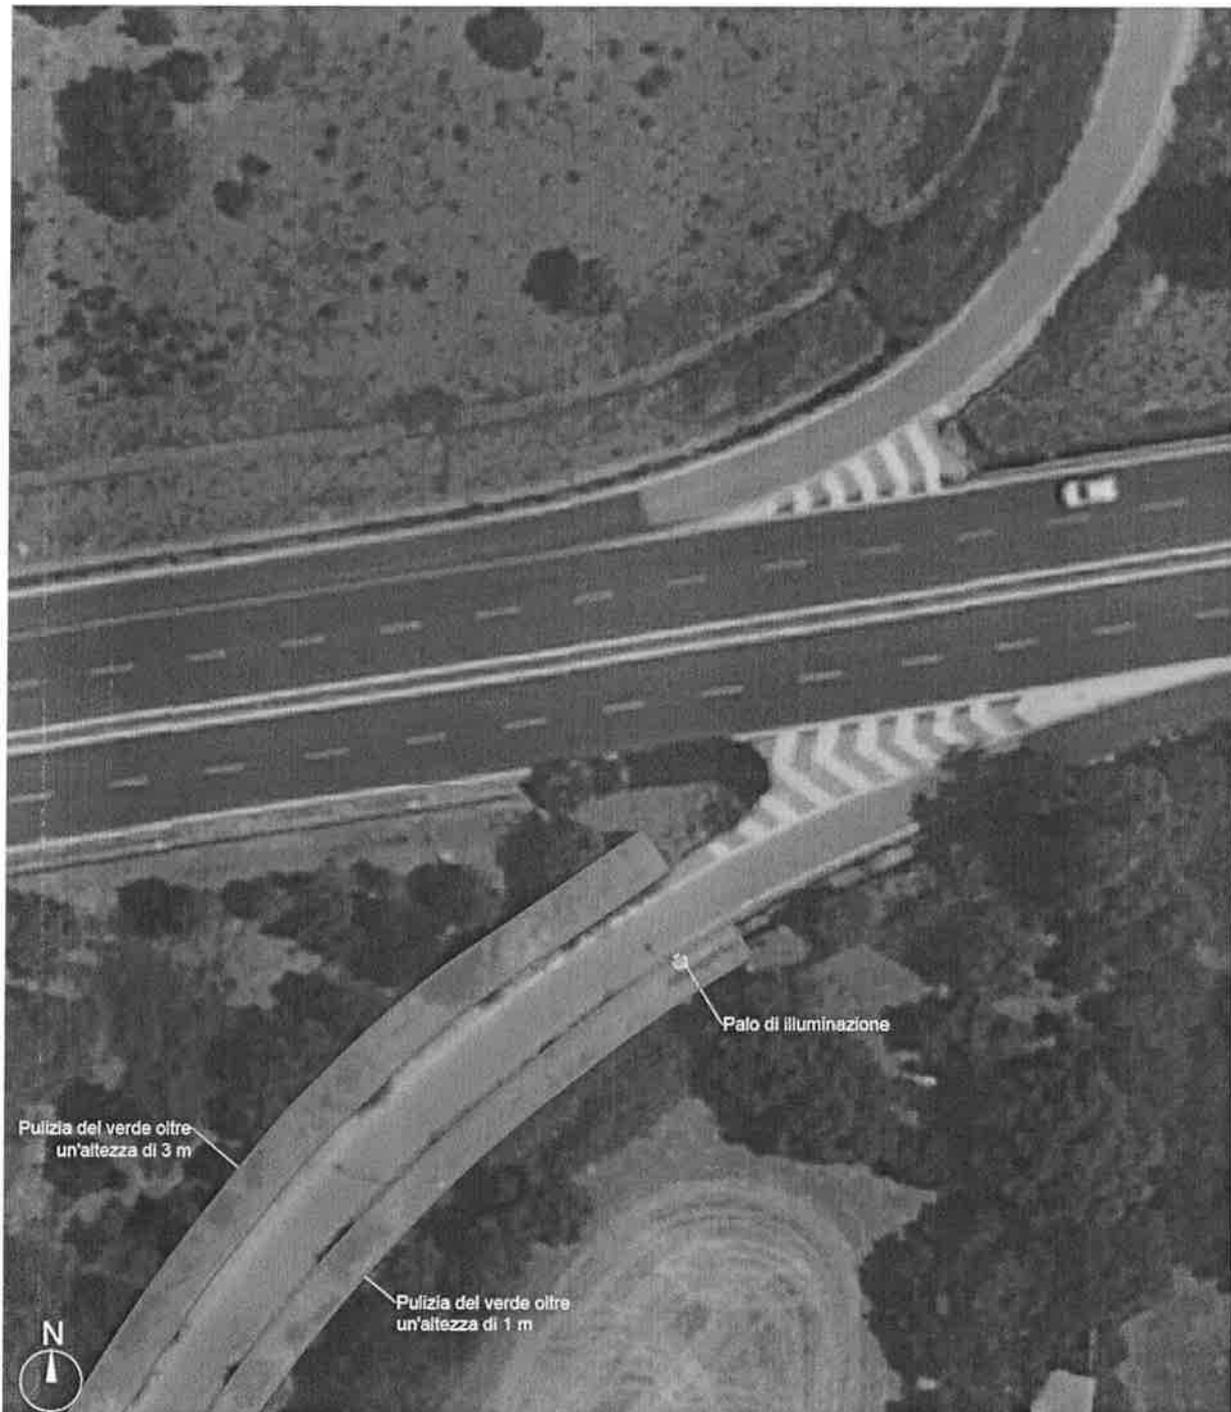


Figura 2.3 – Planimetria indicazione interventi


 	Documento	RELAZIONE TECNICO - DESCRITTIVA		
	Ente	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA		
	Progetto	PARCO EOLICO "MINEO MILITELLO VIZZINI"		
	Revisione	00	Data	23/10/2023

TIPOLOGIE DI LAVORAZIONI NELLA FASE DEGLI INTERVENTI E DEI RIPRISTINI

INTERVENTO	LAVORAZIONI NELLA FASE DEGLI INTERVENTI	LAVORAZIONI NELLA FASE DEI RIPRISTINI
PALO DI ILLUMINAZIONE (RIMOZIONE / RIPRISTINO)	<ul style="list-style-type: none"> - IMBRACATURA DEL PALO CON GRU - DEMOLIZIONE CON MARTELLO DEMOLITORE DELLA CAMICIA IN CEMENTO - RIMOZIONE DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI - RIMOZIONE DEL PALO TRAMITE GRU 	<ul style="list-style-type: none"> - PREPARAZIONE DEL LETTO DI POSA DEL PALO CON SABBIONE - IMBRACATURA DEL PALO CON GRU - POSIZIONAMENTO DEL PALO - COLLEGAMENTO ELETTRICO - POSA DELLA CAMICIA IN CEMENTO
PULIZIA DEL VERDE	<ul style="list-style-type: none"> - TAGLIO DEL VERDE CON L'USO DEL DECESPUGLIATORE - TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA 	
RIMOZIONE ALBERI	<ul style="list-style-type: none"> - TAGLIO CON L'USO DI MOTOSEGA - TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA 	

Matera, 23/10/2023

STUDIO PM S.r.l.
 Via dell'Artigianato, 27
 75100 MATERA (MT)
 P. IVA: 01221180779





Dettaglio Bonifico

Bonifico in stato: **INVIATO** - Data/Ora ultima modifica: 24/10/2023 10:15:29

Stampato il: 24/10/2023 10:15:35

Ordinante

Codice SIA Ordinante	BBXWW	Denominazione Ordinante	STUDIO PM S.R.L.
Banca Assuntrice	05424 BANCA POPOLARE DI BARI		
Rapporto	IT43B0542416100000001000684		STUDIO PM S.R.L.
Codice CUC	1209733N		
Modalità di addebito			

Debitore Effettivo

Ragione Sociale / Nome	
Divisione	Sottodivisione
Stato	Stato Residenza
Città	Provincia
Tipo Indirizzo	CAP
Indirizzo	Numero
Codice Fiscale / Partita Iva	Emesso da

Beneficiario

Ragione Sociale	Libero consorzio Comunale di Siracusa	
IBAN	IT71P0623017102000015180721	BIC
Tipo Identificativo		

Dati operazione

Metodo di pagamento	Bonifico con esito verso ordinante		
Importo	50,00	Divisa	EUR
Data Esecuzione	24/10/2023		
Causale Sepa	Altre causali di pagamento		
Descrizione	Spese di Istruttoria Viabilità Ex ASI		

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

Il sottoscritto: Paolo Montefinese nato a Bari il 25/10/1975; cittadinanza: Italiana Codice fiscale MNTPLA75R25A662F; residente in Italia Comune di Matera via Piazza M. Bianco n. 27 cap 75100
in qualità di Rappresentante legale
dell'impresa Studio PM con sede legale in Matera, via dell'Artigianato
n. 28, con sede operativa [se diversa da quella legale] in _____ via _____ n. _____ n. telefono 0835387575 n. fax _____ pec paolo.montefinese@ingpec.eu Codice Fiscale _____ Partita IVA 01221180779


Con la presente dichiara:

- a. Di accettare a corrispondere le spese per i sopralluoghi necessari;
- b. Di accettare a corrispondere le spese per il deposito cauzionale a garanzia dei lavori effettuati;
- c. Di accettare a corrispondere le dovute marche da bollo da € 16,00 e 1,00 per il rilascio della concessione e dello svincolo.

Luogo e data

Matera, 23/10/2023

Firma


STUDIO PM s.r.l.
Via dell'Artigianato, 27
75100 MATERA (MT)
P. IVA: 01221180779

 	Documento			RELAZIONE TECNICO - DESCRITTIVA		
	Ente			LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA		
	Progetto			PARCO EDUCO "MINEO MILITELLO VIZZINI"		
	Revisione		00	Data		30/11/2023

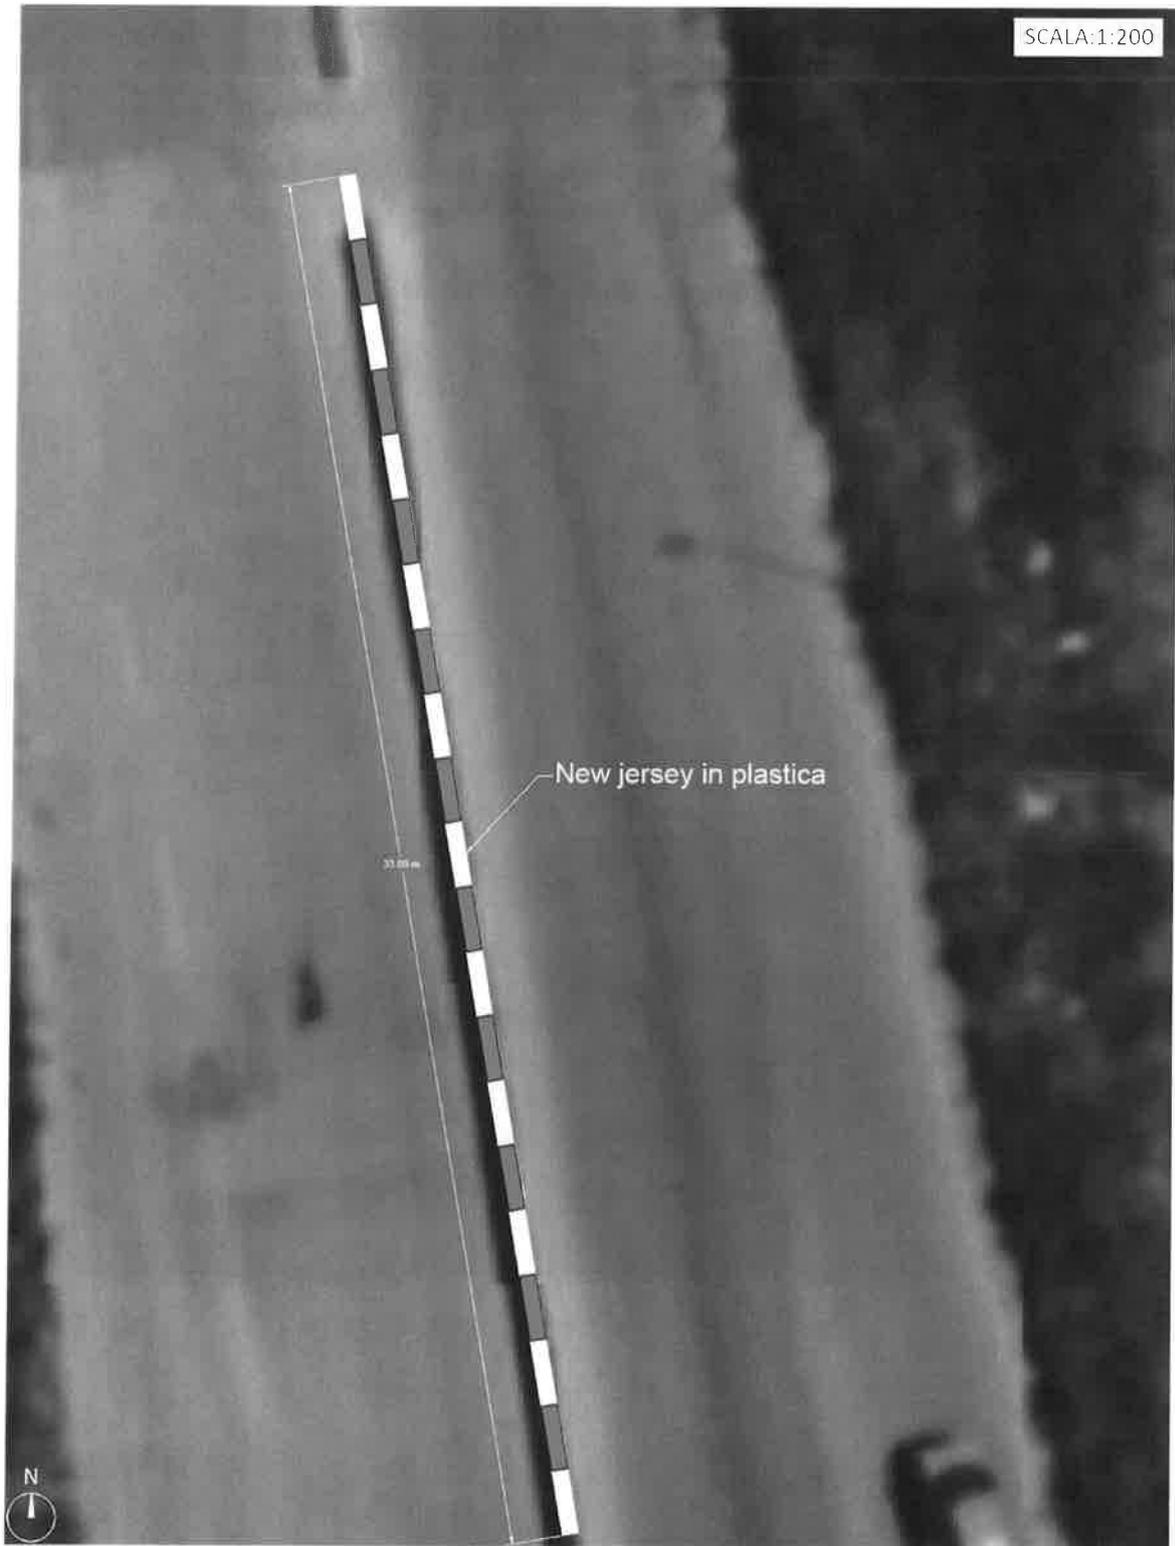


Figura 2.1,2 – Planimetria stato di progetto

 	Documento	RELAZIONE TECNICO - DESCRITTIVA		
	Ente	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA		
	Progetto	PARCO EOLICO "MINEO MILITELLO VIZZINI"		
	Revisione	00	Data	30/11/2023

2.2 VIABILITA' EX ASI PNC ACCESSO AL PORTO COMMERCIALE DI AUGUSTA RAMPA DI DISINNESTO DA S.S. 193 DIREZIONE PORTO (N 37.2459416° E 15.1779°) (OBS 4- OBS5 – OBS6 – OBS7)

OBS 4: Il mezzo transiterà contromano e a causa dell'ingombro dei carichi, si richiedono i seguenti interventi:

- sul lato interno della curva dovrà essere effettuata una pulizia del verde per una profondità di 2m, mentre sul lato opposto per un'altezza di 1 m e una profondità di 12m, per tutta la lunghezza del raggio di curvatura;
- rimozione del palo di illuminazione posto all'interno della curva.



Figura 2.2 – Foto delle lavorazioni da effettuare


 	Documento			RELAZIONE TECNICO - DESCRITTIVA		
	Ente			LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA		
	Progetto			PARCO EOLICO "MINEO MILITELLO VIZZINI"		
	Revisione		00	Data		30/11/2023

OBS 5; Il mezzo transiterà contromano e a causa dell'ingombro dei carichi, si richiedono i seguenti interventi:

- sul lato interno della curva dovrà essere effettuata una pulizia del verde per una profondità di 2m, mentre sul lato opposto per un'altezza di 1 m e una profondità di 12m, per tutta la lunghezza del raggio di curvatura.



Figura 2.2.1 – Foto delle lavorazioni da effettuare

	Documento	RELAZIONE TECNICO - DESCRITTIVA		
	Ente	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA		
	Progetto	PARCO EOLICO "MINEO MILITELLO VIZZINI"		
	Revisione	00	Data	30/11/2023

OBS 6: Il mezzo transiterà contromano e a causa dell'ingombro dei carichi, si richiedono i seguenti interventi:

- sul lato interno della curva dovrà essere effettuata una pulizia del verde per una profondità di 2m, mentre sul lato opposto per un'altezza di 1 m e una profondità di 12m, per tutta la lunghezza del raggio di curvatura;
- rimozione del palo di illuminazione posto all'interno della curva.



Figura 2.2.2 – Foto delle lavorazioni da effettuare

	Documento	RELAZIONE TECNICO - DESCRITTIVA		
	Ente	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA		
	Progetto	PARCO EOLICO "MINEO MILITELLO VIZZINI"		
	Revisione	00	Data	30/11/2023

OBS 7: Il mezzo transiterà contromano e a causa dell'ingombro dei carichi, si richiedono i seguenti interventi:

- sul lato interno della curva dovrà essere effettuata una pulizia del verde per una profondità di 2m, mentre sul lato opposto per un'altezza di 1 m e una profondità di 12m, per tutta la lunghezza del raggio di curvatura;
- rimozione del palo di illuminazione posto all'interno della curva.



Figura 2.2.3 – Foto delle lavorazioni da effettuare



Figura 2.2.4 – Planimetria degli interventi


   	Documento	RELAZIONE TECNICO - DESCRITTIVA		
	Ente	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA		
	Progetto	PARCO EOLICO "MINEO MILITELLO VIZZINI"		
	Revisione	00	Data	30/11/2023

TIPOLOGIE DI LAVORAZIONI NELLA FASE DEGLI INTERVENTI E DEI RIPRISTINI

INTERVENTO	LAVORAZIONI NELLA FASE DEGLI INTERVENTI	LAVORAZIONI NELLA FASE DEI RIPRISTINI
PALO DI ILLUMINAZIONE (RIMOZIONE / RIPRISTINO)	<ul style="list-style-type: none"> - IMBRACATURA DEL PALO CON GRU - DEMOLIZIONE CON MARTELLO DEMOLITORE DELLA CAMICIA IN CEMENTO - RIMOZIONE DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI - RIMOZIONE DEL PALO TRAMITE GRU 	<ul style="list-style-type: none"> - PREPARAZIONE DEL LETTO DI POSA DEL PALO CON SABBIONE - IMBRACATURA DEL PALO CON GRU - POSIZIONAMENTO DEL PALO - COLLEGAMENTO ELETTRICO - POSA DELLA CAMICIA IN CEMENTO
PULIZIA DEL VERDE	<ul style="list-style-type: none"> - TAGLIO DEL VERDE CON L'USO DEL DECESPUGLIATORE - TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA 	
RIMOZIONE ALBERI	<ul style="list-style-type: none"> - TAGLIO CON L'USO DI MOTOSEGA - TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA 	
RIMOZIONE NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO	<ul style="list-style-type: none"> - POSIZIONAMENTO DI NEW JERSEY IN PLASTICA 	<ul style="list-style-type: none"> - RIPOSIZIONAMENTO NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO

Matera, 30/11/2023

STUDIO PM s.r.l.
 Via dell'Artigianato, 27
 75100 MATERA (MT)
 P. IVA: 01221180779



Regione Sicilia

Libero consorzio comunale di Siracusa

Opere di adeguamento temporaneo della viabilità lungo la Viabilità Ex Asi n.1
Svincolo porto commerciale di Augusta, per permettere il passaggio di un
convoglio eccezionale per il trasporto di componenti di turbine eoliche che
costituiranno il Parco Eolico denominato "Mineo Militello Vizzini"

ELABORATO:

RT

TITOLO:

RELAZIONE TECNICA
DESCRITTIVA

RICHIEDENTE:


Innovative Engineering

Studio PM S.r.l.

Via dell'Artigianato, 27, 75100 Matera (MT)

P. IVA: 01221180779

PEC: studiopm@mypec.eu

REV

DATA

DESCRIZIONE

ELABORATO

0

23/10/2023

RT

DATA:

23/10/2023

SCALA:

IL TECNICO





RELAZIONE TECNICO - DESCRITTIVA

Premessa

A corredo della richiesta di integrazione, l'Ing. Montefinese relaziona quanto segue:

1 Percorso completo con tratte di competenza (Figura 1)

I mezzi di trasporto eccezionale partiranno dal Porto di Augusta, si immetteranno lungo la Strada Statale S.S. 193 in direzione Augusta, effettueranno un'inversione nei pressi della rotatoria e riprenderanno la S.S. 193 in direzione Catania – Siracusa. I mezzi proseguiranno lungo la S.S 193 che diventa S.S. 114. Al K 118+900 della S.S. 114, i mezzi prenderanno contromano la rampa di disinnesto della S.S. 114dir. I mezzi proseguiranno fino al Km 12 della S.S. 114dir che diventa S.S. 194. Al Km 40+600 della S.S. 194 i mezzi prenderanno la S.S. 514 che lasceranno al Km 35+800 prendendo lo svincolo per Vizzini, Lucodia E., Militello, per poi prendere la S.P. 28ii e proseguire verso gli accessi ai siti.


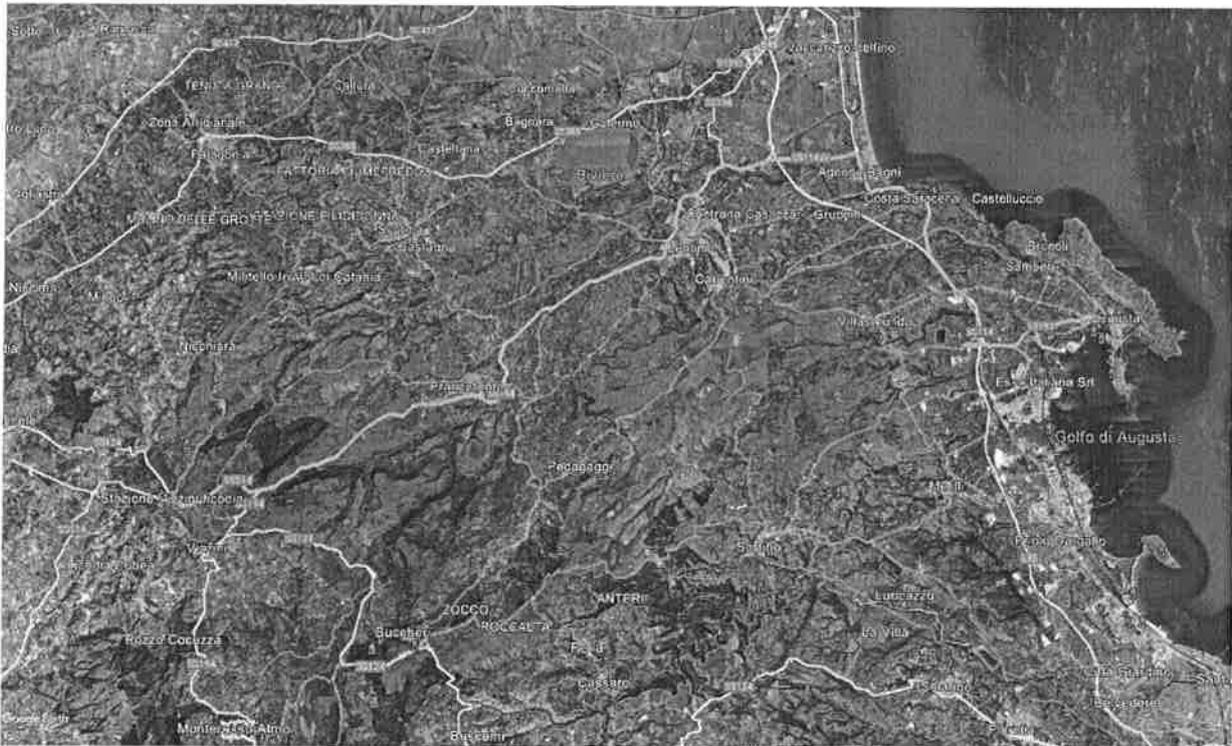


Figura 1

Observation 4.10

Cut all the vegetation from the road surface, for a depth of 15 m, along the entire curve.


Coord: 37°14'23.67" N - 15°8'24.26" E

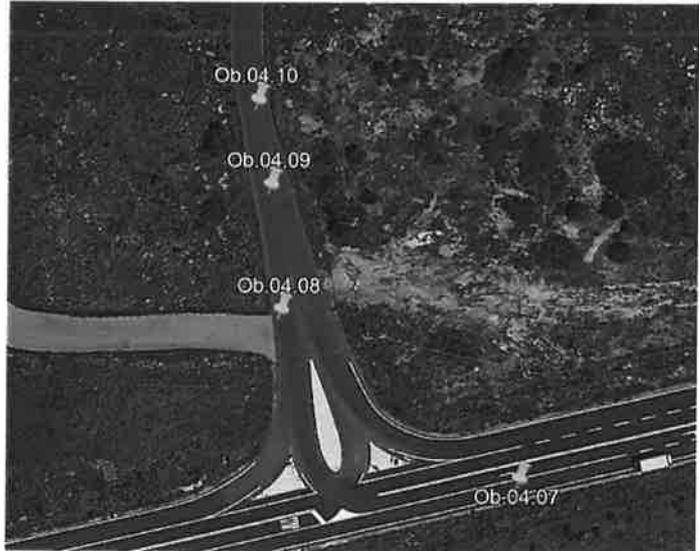

Observation 4.09

Cut all the vegetation above 2.5 m height, before the curve to the right.
Remove the road signal as shown


Coord: 37°14'23.05" N - 15°8'24.39" E

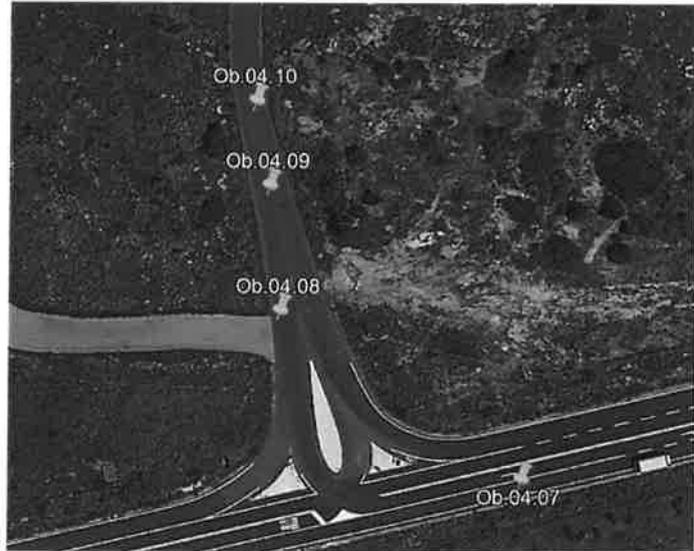

Observation 4.12

Cut all vegetation above 2.5m in height, before the left-hand bend and the vegetation indicated.

Coord: 37°14'24.62" N - 15°8'49.82" E

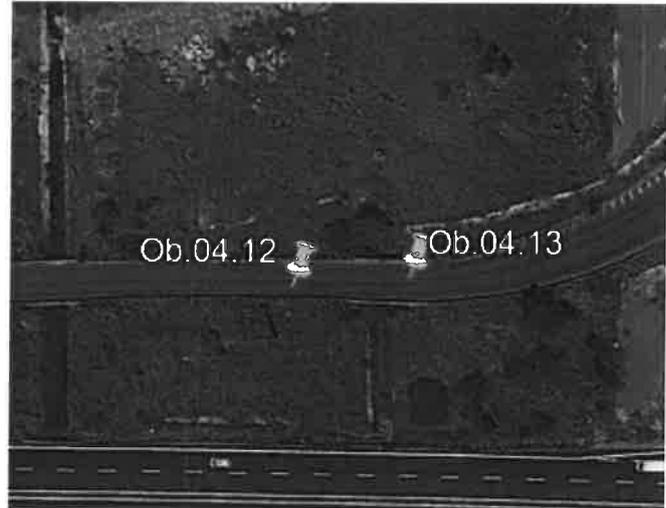

Observation 4.13

On the whole inside curve cut the vegetation indicated.

Coord: 37°14'24.67" N - 15°8'50.64" E



Observation 4.11

Cut all the vegetation above 2.5 m height, before the curve to the left.

Coord: 37°14'24.35" N - 15°8'38.70" E



 	Documento	RELAZIONE TECNICO - DESCRITTIVA		
	Ente	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA		
	Progetto	PARCO EOLICO "MINEO MILITELLO VIZZINI"		
	Revisione	00	Data	30/11/2023

2 Interventi temporanei che si renderanno necessari

Lungo il percorso insistono alcune opere che potrebbero interferire con il carico o con il mezzo. Per tale motivo se ne richiede la manomissione temporanea.

Durante le lavorazioni e nel periodo in cui insisteranno gli interventi, sarà adottata segnaletica da cantiere come da D.M. 10 luglio 2002.

2.1 VIABILITA' EX ASI – SPNC ACCESSO AL PORTO COMMERCIALE DI AUGUSTA RAMPA DI DISINNESTO DA S.S. 193 DIREZIONE PORTO (N 37.2445305° E 15.178722°) (OBS 2)

A causa dell'ingombro dei carichi, si renderanno necessari i seguenti interventi:

- rimozione dei new jersey in calcestruzzo per una lunghezza di 33m;
- posizionamento dei new jersey in plastica per una lunghezza di 33m.



Figura 2.1 – Foto delle lavorazioni da effettuare

 	Documento	RELAZIONE TECNICO - DESCRITTIVA		
	Ente	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA		
	Progetto	PARCO EOLICO "MINEO MILITELLO VIZZINI"		
	Revisione	00	Data	30/11/2023



Figura 2.1.1 – Planimetria stato di fatto

 	Documento	RELAZIONE TECNICO - DESCRITTIVA		
	Ente	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA		
	Progetto	PARCO EOLICO "MINEO MILITELLO VIZZINI"		
	Revisione	00	Data	23/10/2023

2 Interventi temporanei che si renderanno necessari

Lungo il percorso insistono alcune opere che potrebbero interferire con il carico o con il mezzo. Per tale motivo se ne richiede la manomissione temporanea.

Durante le lavorazioni e nel periodo in cui insisteranno gli interventi, sarà adottata segnaletica da cantiere come da D.M. 10 luglio 2002.

2.1 VIABILITA' ASSE DI PENETRAIZIONE VILLASMUNDO (SPNC DENOMINATA "RAMO SECCO") 4.07

a) A causa dell'ingombro dei carichi, si richiedono i seguenti interventi:

- sul lato destro dell'incrocio dovrà essere effettuata una pulizia del verde per una larghezza di 8 m;
- amovibilità dei sostegni della segnaletica stradale presente sulle isole spartitraffico, in modo tale da liberare l'area per un'altezza di 2,50 m. I sostegni saranno sfilati subito prima del passaggio dei mezzi e riposizionati immediatamente dopo.



Figura 2.1 (a) – Foto delle lavorazioni da effettuare

 	Documento	RELAZIONE TECNICO - DESCRITTIVA		
	Ente	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA		
	Progetto	PARCO EOLICO "MINEO MILITELLO VIZZINI"		
	Revisione	00	Data	23/10/2023

b) A causa dell'ingombro dei mezzi, si richiedono i seguenti interventi:

- sul lato destro dell'incrocio dovrà essere realizzato un ampliamento largo 8 m per tutta la lunghezza del raggio di curvatura;
- amovibilità del segnale stradale. I sostegni saranno sfilati subito prima del passaggio dei mezzi e riposizionati immediatamente dopo.



Figura 2.1 (b) – Foto delle lavorazioni da effettuare 4.08

 	Documento			RELAZIONE TECNICO - DESCRITTIVA		
	Ente			LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA		
	Progetto			PARCO EOLICO "MINEO MILITELLO VIZZINI"		
	Revisione		00	Data		23/10/2023

- c) A causa dell'ingombro dei carichi, si richiedono i seguenti interventi:
- sul lato sinistro della strada dovrà essere effettuata una pulizia del verde che supera l'altezza di 2,50m.



Figura 2.1 (c) – Foto delle lavorazioni da effettuare

4.09

 	Documento	RELAZIONE TECNICO - DESCRITTIVA		
	Ente	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA		
	Progetto	PARCO EOLICO "MINEO MILITELLO VIZZINI"		
	Revisione	00	Data	23/10/2023

d) A causa dell'ingombro dei carichi, si richiedono i seguenti interventi:

- sul lato destro della strada dovrà essere effettuata una pulizia del verde per una larghezza di 15 m lungo tutto il raggio di curvatura;



Figura 2.1 (d) – Foto delle lavorazioni da effettuare

4.10

Documento	RELAZIONE TECNICO - DESCRITTIVA		
Ente	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA		
Progetto	PARCO EOLICO "MINEO MILITELLO VIZZINI"		
Revisione	00	Data	23/10/2023

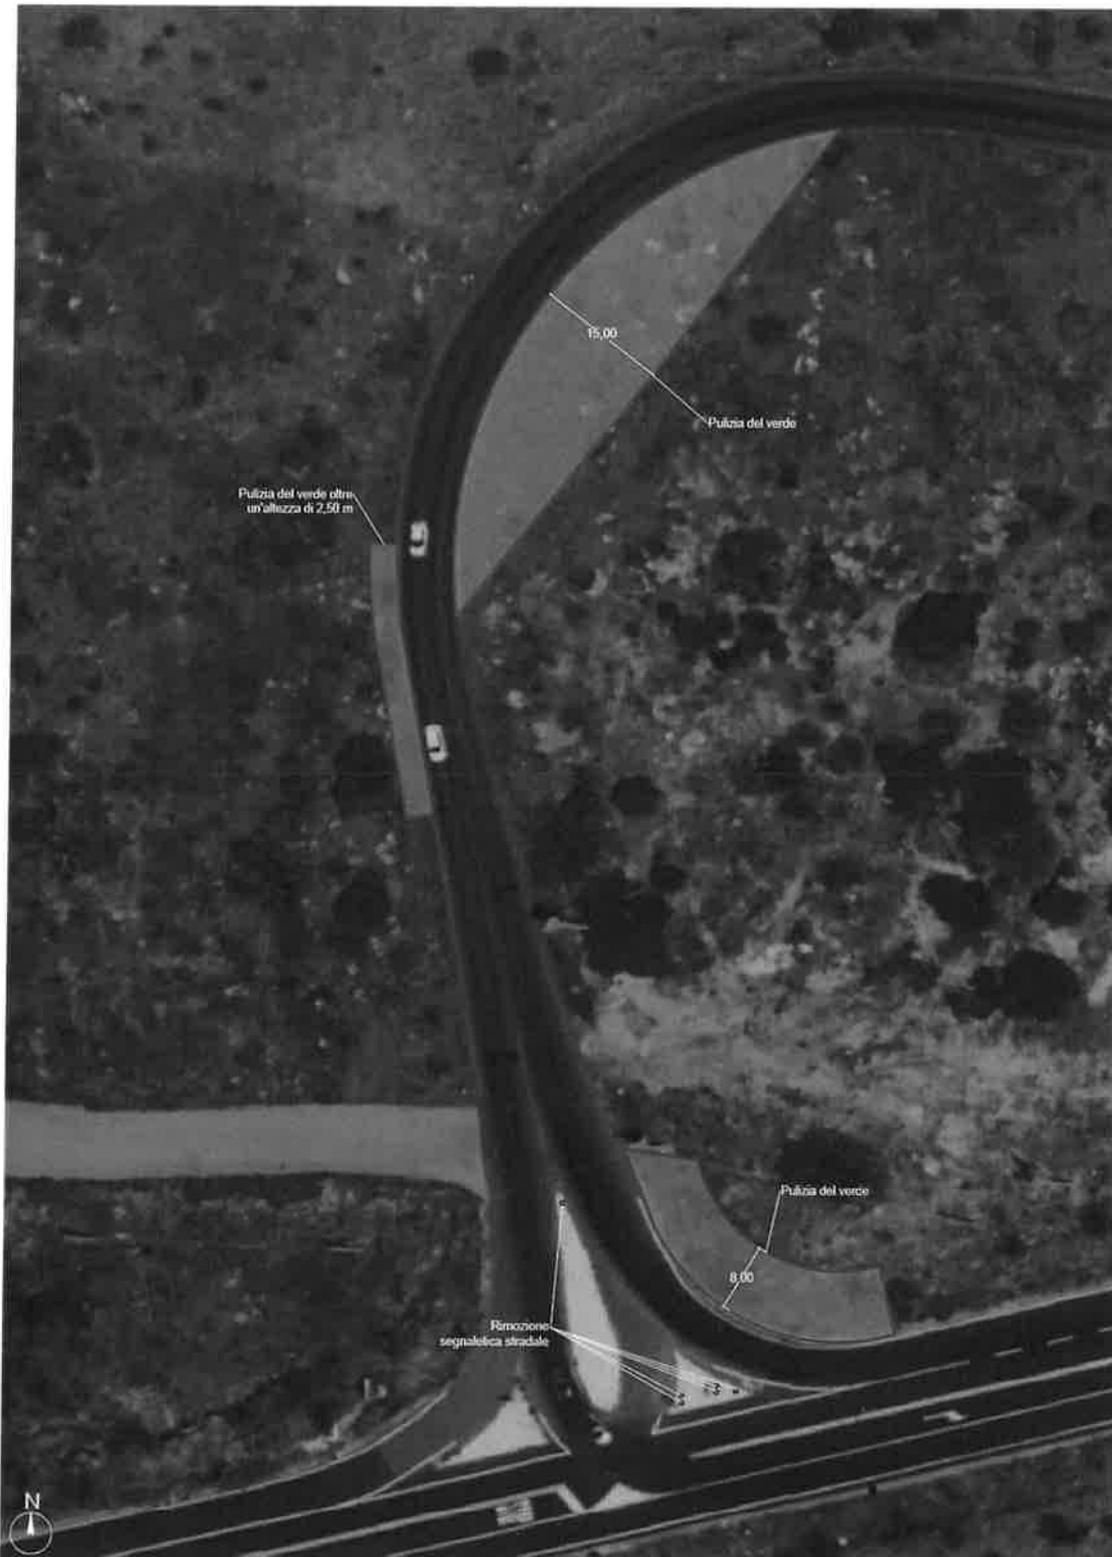


Figura 2.1 - Planimetria indicazione interventi

 	Documento	RELAZIONE TECNICO - DESCRITTIVA		
	Ente	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA		
	Progetto	PARCO EOLICO "MINEO MILITELLO VIZZINI"		
	Revisione	00	Data	23/10/2023

2.2 VIABILITA' ASSE DI PENETRAZIONE VILLASMUNDO (SPNC DENOMINATA "RAMO SECCO")

A causa dell'ingombro del carico bisognerà effettuare i seguenti interventi:

- eliminare la vegetazione che supera i 2,50 m di altezza sul lato destro della strada poco prima della curva;
- eliminare la vegetazione sul guardrail presente lungo il raggio di curvatura.



Figura 2.2 (a) – Foto delle lavorazioni da effettuare

4.11

Documento	RELAZIONE TECNICO - DESCRITTIVA		
Ente	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA		
Progetto	PARCO EOLICO "MINEO MILITELLO VIZZINI"		
Revisione	00	Data	23/10/2023



Figura 2.2 (b) – Foto delle lavorazioni da effettuare



Figura 2.2 (c) – Foto delle lavorazioni da effettuare

   	Documento			RELAZIONE TECNICO - DESCRITTIVA		
	Ente			LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA		
	Progetto			PARCO EOLICO "MINEO MILITELLO VIZZINI"		
	Revisione		00	Data		23/10/2023

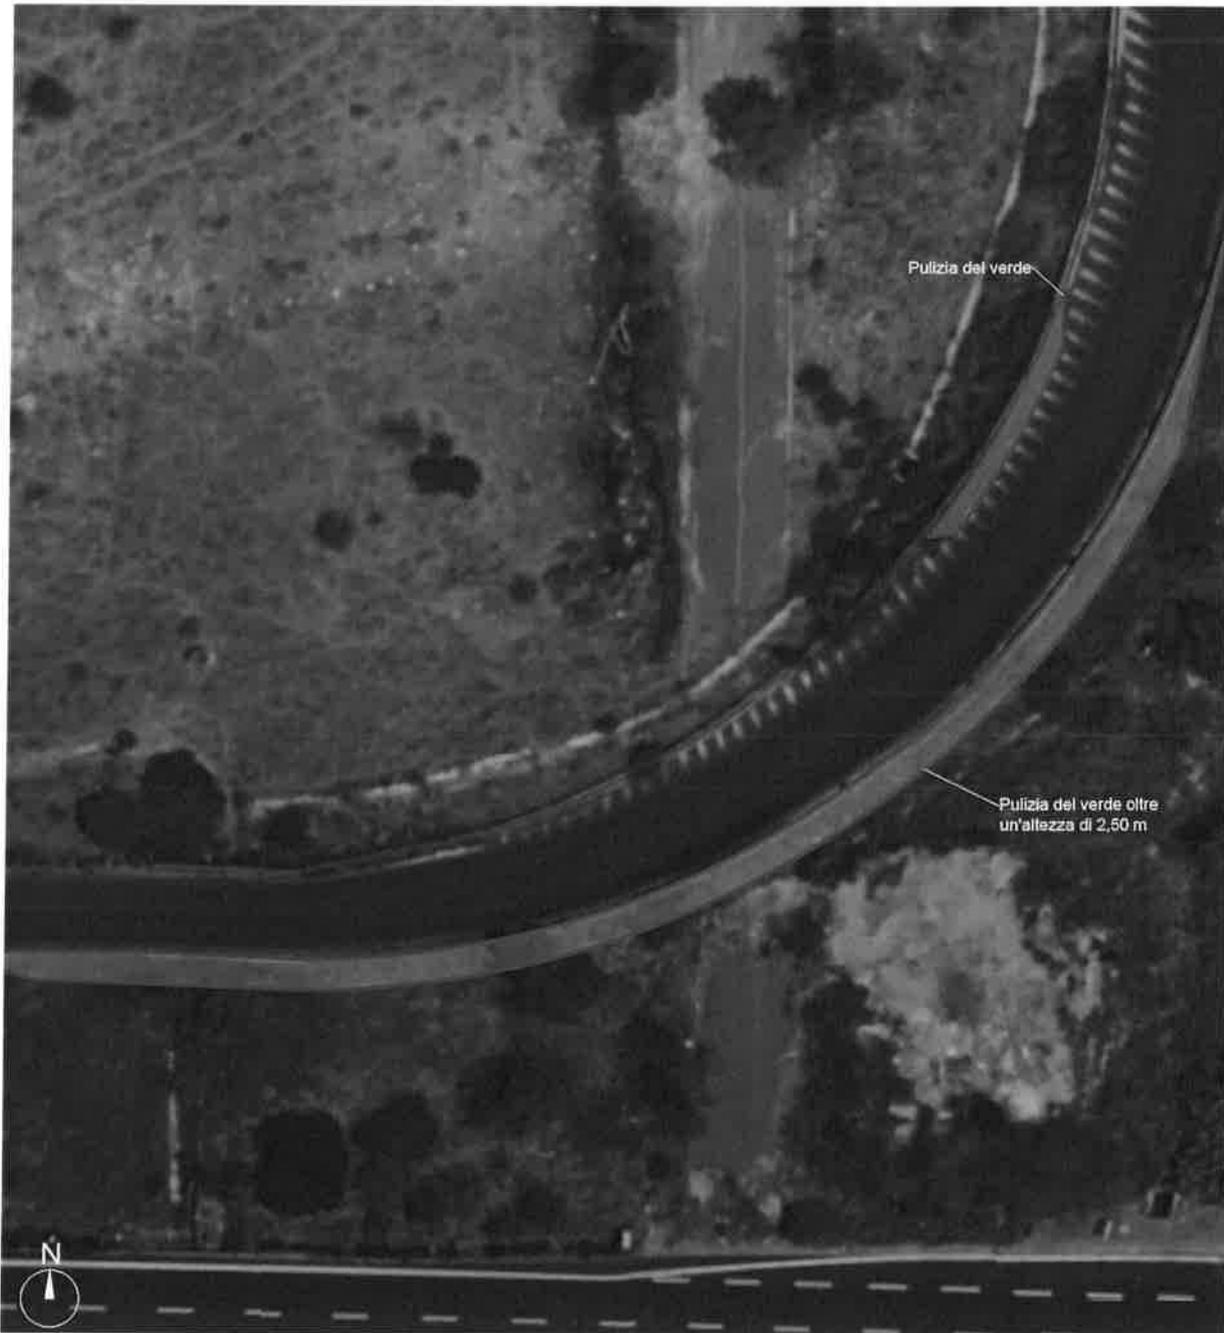



Figura 2.2 - Planimetria indicazione interventi

 	Documento	RELAZIONE TECNICO - DESCRITTIVA		
	Ente	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA		
	Progetto	PARCO EOLICO "MINEO MILITELLO VIZZINI"		
	Revisione	00	Data	23/10/2023

TIPOLOGIE DI LAVORAZIONI NELLA FASE DEGLI INTERVENTI E DEI RIPRISTINI

INTERVENTO	LAVORAZIONI NELLA FASE DEGLI INTERVENTI	LAVORAZIONI NELLA FASE DEI RIPRISTINI
PULIZIA DEL VERDE	<ul style="list-style-type: none"> - TAGLIO DEL VERDE CON L'USO DEL DECESPUGLIATORE - TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA 	
RIMOZIONE ALBERI	<ul style="list-style-type: none"> - TAGLIO CON L'USO DI MOTOSEGA - TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA 	


Matera, 30/11/2023

STUDIO PM s.r.l.
 Via dell'Artigianato, 27
 75100 MATERA (MT)
 P. IVA: 01221180779


Observation 4.07

Cut all the vegetation from the road surface, for a depth of 8 m, along the entire curve. Ensure that the space above 2.5 m in height is free of obstacles.

Coord: 37°14'20.91" N - 15°8'26.69" E

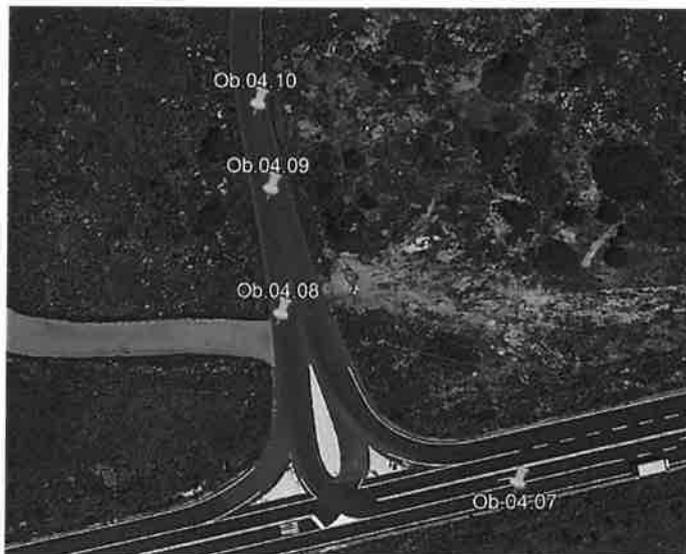

Observation 4.08

Cut all the vegetation from the road surface, for a depth of 8 m, along the entire curve.
Remove the indicated road sign.

Coord: 37°14'22.14" N - 15°8'24.49" E



Google Earth



PORT
AUGUSTA



Google Earth



